緊急兼行動不便

工 地 巡 查 紀 錄 表

全樓層無內凹樑

工番		號機	#1/2
工名	協勝建設		
機種			
電梯規格	800kg 12人 105m/min，2台聯控 18T		

覆核			巡查人員



電梯昇降道平面示意圖

A 棟



乘場留孔立面示意圖



電梯機房平面示意圖

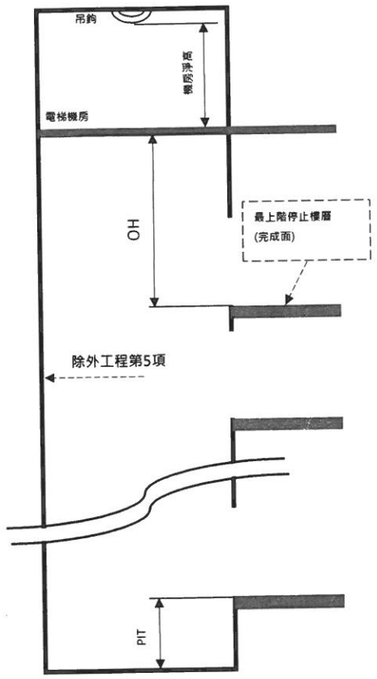

昇降道剖面示意圖

尺寸單位(mm)

樓名	階名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	PIT	OH	機房淨高	樓高	測量日	測量員
B3	1 T	420	1045	415	420	1050	420	2050	2050	2045																	
B2	2 T	415	1050	420	415	1055	425	2045	2045	2045																	
B1	3 T	425	1035	420	420	1050	425	2055	2035	2050																	
1	4 T	420	1040	415	420	1045	425	2050	2190	2190																	
2	5 T	410	1050	420	420	1055	430	2055	2200	2190																	
3	6 T	415	1040	410	410	1045	425	2065	2185	2190																	
4	7 T	415	1035	415	425	1050	415	2050	2190	2195																	
5	8 T	420	1050	420	415	1055	420	2055	2200	2190																	
6	9 T	425	1045	410	420	1045	430	2050	2185	2195																	
7	10 T	415	1045	415	425	1050	425	2060	2190	2200																	
8	11 T	410	1040	425	420	1055	435	2050	2200	2200																	
9	12 T	420	1045	410	420	1045	435	2055	2220	2210																	
10	13 T	425	1040	415	420	1045	435	2060	2230	2215																	
11	14 T	420	1045	425	420	1045	420	2055	2215	2220																	
12	15 T	425	1045	425	425	1050	435	2050	2200	2210																	
13	16 T	420	1045	420	425	1050	430	2050	2190	2200																	
14	17 T	415	1045	420	425	1045	420	2060	2195	2200												#1 2180	#1 5670			9.22	3塔
R	18 T	410	1045	415	420	1045	425	2055	2185	2200												#2 2185	#2 5680				
	T																										
	T																										

機房尺寸(寬*長)			換氣窗/通氣窗	□有 □無	機械室依留孔圖	□有 □無	
機房門尺寸(寬*高)			冷氣	□有 □無	一次動力盤	□有 □無	
吊鉤	□有 □無		機房照明燈	□有 □無	枕樑設置需求	□打牆 □不打牆	

乙方:除外工程項目

1.門框完成後嵌縫工程。
2.PIT機坑防水工程。
3.乘場門框、按鈕顯示器、機房落入孔開孔預留工程，電梯承商負責機房落入孔放樣。
4.機房主機樑下，提供足夠應力足以承受主機反力，反力值電梯承商提供。
5.井道內模板、鋼筋突出及防墜網未拆除完成，請於電梯設備進場施工前清除完成。
6.機房內一次動力電源盤請於電梯施工前，依機電圖提供電梯試車所需之一次側配電盤體及NFB。
7.建物為鋼骨結構時，電梯井道安裝所需環樑、立柱、出入口門型架施作。

備註

1.機坑深度(不含防水層)。
2.OH高度(不含最上階樓地板修飾高度)。
3.電梯注意電源配入位置及二次側配管配線(依照甲方機電圖設置)。
4.依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法第三條之規定：昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。
5.電梯車廂若設置冷氣時，甲方須提供獨立電源 1P 220v 30A NFB。 6. 依CNS 2866 4.1.1.1
(11) 升降機檢查標準規定：「任一機械室內，若其底板之高度，相差超過60cm時，在不平之處，須裝適當之護欄及梯子。」

※上列乙方除外工程及備註事項，已向甲方報告說明，呈請甲方依約配合。

甲方備註	

合約電梯預計出貨日 _____

甲方現場需求電梯預計出貨日 _____

甲方確認 _____

F-E-016 C

'21-01
